

## تقرير تقدم تنفيذ المساعدات الموظفة

للسنة المنقضية (SQD 2020)

### 1- معطيات عامة بخصوص البلدية :

أ - إسم البلدية : بلدية الناظور :

تأسست بلدية الناظور بمقتضى الامر عدد 309 لسنة المؤرخ في 30 سبتمبر 1968 .

مساحة المنطقة البلدية : 35543 هكتار

مساحة مثال التهيئة العمرانية : 342 هكتار .

العنوان : بلدية الناظور نهج عقبة ابن نافع الناظور 1160 زغوان

الهاتف : 72 678 811 Téléphone :

الفاكس : 72 678 532 Fax :

Adresse e-mail : [contact@commune-ennadhour.tn](mailto:contact@commune-ennadhour.tn)

ب - الموقع الجغرافي للبلدية : تقع مدينة الناظور في جنوب شرق ولاية زغوان

تبعد عن تونس العاصمة 100 كلم.

تبعد عن مدينة زغوان 47 كلم.

تبعد عن مدينة القيروان 60 كلم.

تبعد عن مدينة سوسة 60 كلم.

اهم الطرقات العابرة للمدينة :

. الطريق المتوسطة عدد 48 الرابطة بين الناظور وسوسة عبر كندار .

. الطريق الفرعية عدد 644 الرابطة بين الناظور ومدينة النفيضة .

. الطريق الوطنية عدد 03 المؤدية الى القيروان .

ج - عدد السكان بالبلدية : 30366 ساكن . ذكور : 14800 . اناث : 15566

عدد المساكن : 7618 مسكن

عدد الاسر: 6857 اسرة

حسب التعداد العام للسكان والسكني لسنة 2014

## **2- معطيات بخصوص الحي الشعبي المعني:**

أ - وصف الحي المعني بالتدخل:

**1.2-الحي الشمالي** : يحده نهج 14 جانفي الطريق المحلية رقم 644 ونهج الفردوس ونهج

تزرقة ونهج الجم

ب - الموقع الجغرافي للحي بالبلدية : شمال المنطقة البلدية ويمسح حوالي 71.540 هكتار

ج- عدد السكان بالحي المعني : 2692

ت - النسبة المئوية لسكان الحي من سكان البلدية : 35%

**2.2- حي المنارة** : يحده نهج 14 جانفي الطريق المحلية رقم 644 وشارع المنجي سليم ونهج

العربي زروق وحدود مثال التهيئة العمرانية من الجهة الجنوبية

ب - الموقع الجغرافي للحي بالبلدية: جنوب غرب المنطقة البلدية ويمسح حوالي 12.5 هكتار

ج- عدد السكان بالحي المعني : 1200

ت - النسبة المئوية لسكان الحي من سكان البلدية : 15%

## **3- معطيات بخصوص كل حي معني بالتدخل، خلال مرحلة البرمجة:**


أ - وصف الحي المعني بالتدخل:

## الحي الشمالي



الحي	الطول (بالكلم)	المساحة حسب الحالة					مجري المياه
		جيدة (م <sup>2</sup> )	متوسطة (م <sup>2</sup> )	ردينة (م <sup>2</sup> )	غير معبد (م <sup>2</sup> )	الأرصفة طول (م <sup>2</sup> )	
الحي الشمالي	13.030	2270	3000	4110	3610	26000	نوعية T2
							9900
							نوعية CS2 - تصريف سطحي - 1800 متر قنوات تصريف مياه الأمطار
التنوير العمومي		الربط بشبكة للشرب		الربط بشبكة الماء الصالح		الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة	
%75		%85		%80			

## حي المنارة

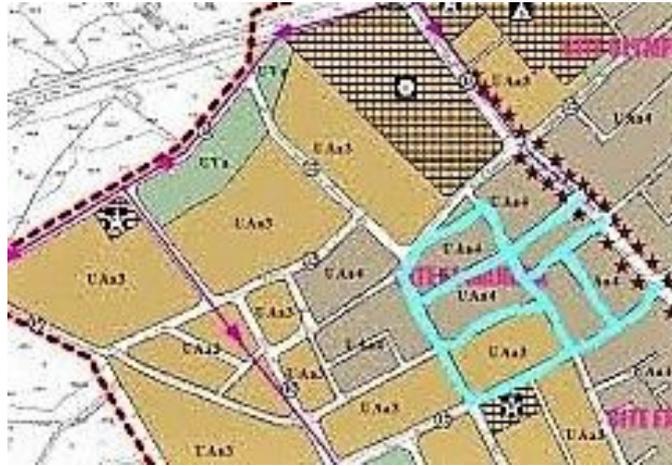

الحي	الطول (بالكلم)	المساحة حسب الحالة					مجري المياه
		جيدة (م <sup>2</sup> )	متوسطة (م <sup>2</sup> )	ردينة (م <sup>2</sup> )	غير معبد (م <sup>2</sup> )	الأرصفة طول (م <sup>2</sup> )	
حي المنارة	5.000	460		2840	1700	9400	نوعية T2
							3500
							نوعية CS2 تصريف سطحي
التنوير العمومي		الربط بشبكة للشرب		الربط بشبكة الماء الصالح		الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة	
%80		%90		%90			

ب - المبلغ المالي المخصص للمشروع: 850 أ.د.

ت - الخطة التمويلية للمشروع بما فيها المساعدة الموظفة:

الخطة التمويلية	
فواضل المساعدة الموظفة (850 أ.د.)	211.025 د

ث- رزنامة الإنجاز المبرمجة: 180 يوم

ج - عدد سكان الحي المتوقع انتفاعهم بالمشروع : كل سكان الحي

ح - الصنف البيئي والاجتماعي للمشروع : C

**4- معطيات بخصوص كل حي معني بالتدخل، خلال مرحلة الإعداد:**

أ - تاريخ إيداع الدراسات الأولية للمشروع لدى الصندوق: 2018/07/03

ب - مبلغ المساعدة غير الموظفة المخصصة للمشروع

ت- انعقدت الجلسة التشاركية ضمن اعاد البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 الخاصة بالحي الشمالي وحي المنارة يوم الاربعاء 08 ديسمبر 2018 على عين المكان (ميدانيا) ومن أهم نتائجها:  
- ضرورة المحافظة على المشروع من خلال عدم إلقاء فواضل البناء بصفة عشوائية وعدم رمي الأوساخ والنفايات .

- ضرورة تحسيس جميع مساكني البلدية بدفع الأداءات البلدية الموظفة على عقاراتهم بعنوان سنة 2019 وما قبلها حتى يتسنى للبلدية الإيفاء بالتزاماتها في مجال الصيانة والتعهد.

- كما أن البلدية ستتولى إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع كل مخالف للتراتب البيئية وخاصة إلقاء الأوساخ بالحدائق المعنية بالتدخل.

ث - نكر الإجراءات البيئية والاجتماعية التي تم إقرارها:

يلتزم المقاول بتطبيق واحترام جميع شروط التصرف البيئي في أنشطة البناء المنصوص عليه بالبواب عدد 6 من كراس الشروط الفنية الخاصة وتطبيق الاجراءات الواردة المتعلقة بالاشغال ويتولى اتخاذ التدابير الضرورية على نفقته للوقاية او الحد او التعويض عند تأثيرات سلبية على البيئة وعلى الافراد قد تنتج جراء انجاز الاشغال موضوع الصفقة. كما يلتزم باحترام قواعد الحماية البيئية والاجتماعية المتعارف عليها في مجال البناء والاشغال العمومية وجميع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة وسارية المفعول.

يجب على المقاول مباشرة, اثر تسلمه للاذن الاداري ببدأ الاشغال, تعيين عون يكلف بالحماية البيئية (عون الصحة والسلامة البيئية) من بين الاعوان الراجعين له بالنظر يكون متواجدا طول الوقت بالحضيرة واعلام صاحب المشروع بذلك. يتولى عون الحماية البيئية تحت مسؤولية المقاول السهر على احترام وتطبيق الشروط البيئية واجراءات الوقاية والحد للتاثيرات السلبية.

تتم متابعة تنفيذ ومدى احترام هذه الشروط والاجراءات من طرف المسؤول البيئي والاجتماعي ورئيس المشروع ومكتب الدراسات المكلفين من صاحب المشروع خلال زيارة الحضيرة لمراقبة الاشغال وفقا لبرنامج المتابعة البيئية. ويتم تسجيل المخالفات والاخلالات بدفتر الحضيرة واعلام المقاول بها بالاضافة الى رفع تقارير في الغرض الى صاحب المشروع.

في صورة عدم احترام المقاول للشروط المنصوص عليها وان لم يمتثل بعد التنبيه عليه كتابيا, يتخذ صاحب المشروع الاجراءات اللازمة على نفقة المقاول لاصلاح وتعويض تبعات اي اخلال بالاضافة الى حفظ كامل حقوق التدخل للسلطات المختصة لتطبيق الاجراءات القانونية او الترتيبية الجاري بها العمل في مجال الحماية البيئية والاجتماعية وتسليط العقوبات المالية المنصوص عليها بالقانون.

ويتم خصم المبالغ الضرورية لاصلاح وتعويض الاخلالات المسجلة من مستحقات المقاول بعنوان تنفيذ الصفقة.

في صورة تمادي المقاول في عدم احترام قواعد الحماية البيئية والشروط المنصوص عليها بالصفقة يتخذ صاحب المشروع تجاهه الاجراءات الجزرية المناسبة والتي قد تصل الى حد فسخ الصفقة عى مسؤوليته

**ج - تاريخ موافاة الصندوق بالدراسات الفنية الخاصة بالمشروع: 04 جويلية 2019.**

**ح- الطرق المعتمدة للمنافسة ولإسناد الصفقات (التواريخ والإجراءات):**

**نشر إعلان طلب عروض بالصحف اليومية: جريدة المغرب بتاريخ 2019/05/21**

**جريدة الشروق بتاريخ 2019/05/22**

**نشر بالموقع الوطني للصفقات العمومية بتاريخ 2019/05/21**

**خ- نتائج الإعلان عن المنافسة:**

**- اسم المقاول التي تم اختيارها: شركة تميم للاشغال العامة.**

**- مبلغ الصفقة: 198.741,183 د**

**د- مبلغ المساعدة الموظفة (فواضل) المبرمجة لفائدة المشروع ببرنامج الاستثمار السنوي للسنة المنقضية (2019):**

**211.025 د**

**ذ- مبلغ المساعدة الموظفة المعلن عليه بتاريخ 15 فيفري (2016): 850 ا.د.**

## 5- معطيات بخصوص كل حي معني بالتدخل، خلال مرحلة الإنجاز:

أ - المبلغ الذي تم إعطاء الإذن بدفعه بعنوان المشروع خلال السنة المنقضية 2019 و2020:

بعنوان الاشغال	بعنوان الدراسات	
د 15.070,144	د 5.688,077	سنة 2019
د 158.495,521	د 3.122,112	سنة 2020
د 173.565,665		الجملة :

ب - المبلغ الذي تم تحويله من طرف الصندوق لفائدة البلدية بعنوان المشروع والذي تم دفعه لمكتب الدراسات وللمقاولات الموكول لها تنفيذ المشروع خلال السنة المنقضية (2019 و2020):

بعنوان الاشغال	بعنوان الدراسات	
د 15.070,144	د 5.688,077	سنة 2019
د 183.671,039	د 3.122,112	سنة 2020
د 198.741,183	د 8.810,189	الجملة :

ت- وصف تقدم إنجاز الأشغال الخاصة بالمشروع مع تفسير أسباب التأخير مع ذكر الرزنامة الجديدة للإنجاز:نسبة تقدم الاشغال تقدر ب 100 % .

ث - وصف إجراءات الحماية البيئية والاجتماعية التي تم وضعها فعليا ومقارنتها بتلك التي كانت مبرمجة أوليا وتفسير التغييرات إن وجدت:

ج - عدد السكان المنتفعين فعليا بالمشروع:

ح- النسبة المئوية للنساء المنتفعات فعليا بالمشروع مقارنة بالعدد الجملي للمنتفعين:

**على مستوى البلدية :**

خ - طول الطرقات البلدية المبرمجة بالمنطقة البلدية :

د - طول الطرقات البلدية المعبدة :

**على مستوى الحي :**

ذ - طول الطرقات المبرمجة بالمنطقة البلدية داخل الحي المعني :

ر - طول الطرقات المعبدة بالحي قبل المشروع :

ز - طول الطرقات التي سيتم تعبيدها بالحي في إطار المشروع :

س - عدد النقاط الضوئية التي تم تركيزها بالحي في إطار المشروع :

ش - عدد الحدائق بالحي في إطار المشروع : **02 حدائق بالحي الشمالي**  
**01 حديقة بالحي المنارة**

الناظر في :

رئيس البلدية

سالم الذيري
